INSTITUT 2iE

Programme de bourses de la Fondation Mastercard

Activité Give Back

CALENDRIER DE DÉVELOPPEMENT

Plateforme numérique de don de sang et de traçabilité des poches

Du lundi 19 octobre au dimanche 20 décembre 2026

9 semaines, 7 jalons

Document complémentaire au cahier des charges

1. Vue d'ensemble

Le prototype doit être livré le **dimanche 20 décembre 2026**. Le travail est découpé en 9 semaines, du lundi au dimanche, avec un jalon à la fin de la plupart des semaines. Un jalon est un point de contrôle : ce qui y est indiqué doit être terminé à cette date.

Le calendrier suit les étapes de l'Annexe D du cahier des charges, dans cet ordre :

1. **Semaines 1 et 2** : validation, contrat d'API, maquettes et base de données.
2. **Semaines 3 à 7** : développement en parallèle des deux binômes.
3. **Semaine 8** : tests de bout en bout et corrections.
4. **Semaine 9** : mise en ligne et test dans un centre pilote.

Le binôme application travaille d'abord sur des exemples JSON (semaines 3 et 4), puis se branche au vrai backend (semaines 5 et 6). C'est ce qui permet aux deux binômes d'avancer en même temps sans s'attendre.

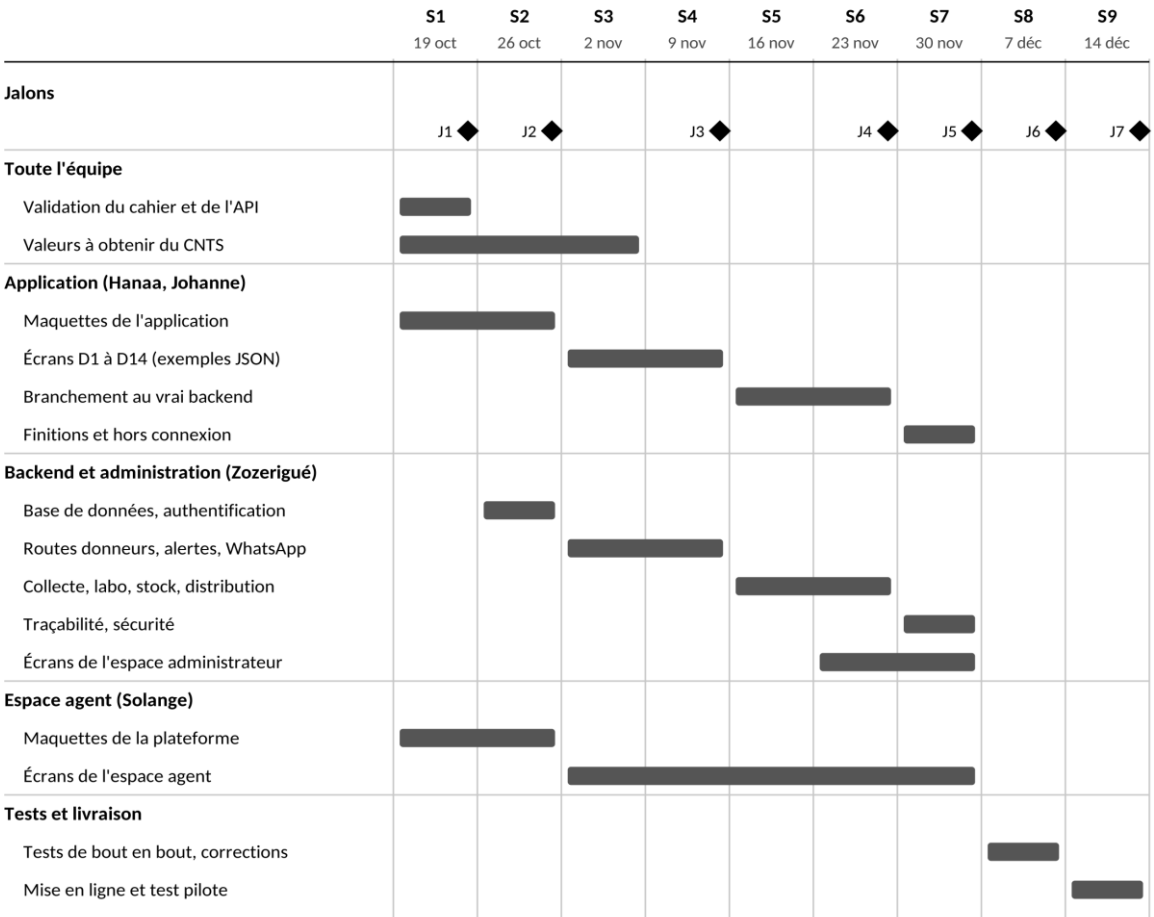


Figure 1. Planning des 9 semaines (les losanges marquent les jalons)

Les semaines

Semaine	Dates	Objectif de la semaine
S1	du 19 au 25 octobre	Tout le monde part sur la même base
S2	du 26 octobre au 1er novembre	Maquettes terminées, base de données en place
S3	du 2 au 8 novembre	Les premiers écrans prennent vie
S4	du 9 au 15 novembre	Toutes les routes de l'application des donneurs disponibles
S5	du 16 au 22 novembre	Brancher l'application et lancer la traçabilité
S6	du 23 au 29 novembre	Application des donneurs complète
S7	du 30 novembre au 6 décembre	Plateforme complète (priorité 1)
S8	du 7 au 13 décembre	Tout tester et corriger
S9	du 14 au 20 décembre	Mise en ligne, test réel et livraison

2. Les jalons

Chaque jalon est vérifié lors du point d'équipe suivant. Un jalon non atteint est signalé à toute l'équipe le jour même.

Jalon	Date	Ce qui doit être prêt
J1	Dimanche 25 octobre	Cahier des charges validé par les quatre développeurs ; contrat d'API figé ; exemples JSON de toutes les routes de l'application des donneurs livrés
J2	Dimanche 1er novembre	Maquettes de l'application et de la plateforme validées ; les 28 tables créées sur Supabase ; connexion des donneurs et des agents fonctionnelle
J3	Dimanche 15 novembre	Toutes les routes de l'application des donneurs fonctionnent sur le vrai backend, y compris les alertes et WhatsApp
J4	Dimanche 29 novembre	Application des donneurs entièrement branchée au vrai backend : compte, carte, alertes, réponses, notifications
J5	Dimanche 6 décembre	Toutes les fonctionnalités de priorité 1 de la plateforme disponibles (P1 à P10), dans l'espace agent et dans l'espace administrateur
J6	Dimanche 13 décembre	Version prête pour la mise en ligne : le scénario complet passe, aucun bug bloquant
J7	Dimanche 20 décembre	Prototype en ligne, testé dans un centre pilote et livré avec sa documentation

3. Le calendrier semaine par semaine

Semaine 1 : du 19 au 25 octobre

Objectif : tout le monde part sur la même base.

Qui	Tâches de la semaine
Toute l'équipe	Réunion de lancement le lundi 19 octobre : lecture et validation du cahier des charges. Création du dépôt GitHub commun. Prise de contact avec le CNTS pour fixer un rendez-vous.
Hanaa, Johanne	Confirmer le choix de l'application web installable (PWA) avant le mercredi 21 octobre. Maquettes des écrans D1 à D7 : ouverture, bienvenue, inscription, vérification du numéro, connexion, mot de passe oublié, nouveau mot de passe.
Zozerigué	Figer le contrat d'API avec Solange. Écrire un exemple de réponse JSON pour chaque route de l'application des donneurs. Créer le projet Supabase. Lancer la création du compte WhatsApp Business et choisir le numéro du projet.
Solange	Figer le contrat d'API avec Zozerigué. Maquettes des écrans de connexion, du tableau de bord et de l'accueil des donneurs.

Jalon J1 (dimanche 25 octobre) : cahier des charges validé, contrat d'API figé, exemples JSON livrés.

Semaine 2 : du 26 octobre au 1er novembre

Objectif : maquettes terminées et base de données en place.

Qui	Tâches de la semaine
Toute l'équipe	Revue des maquettes en réunion et validation. Rendez-vous avec le CNTS : présenter le projet et demander les valeurs de l'Annexe E du cahier des charges.
Hanaa, Johanne	Maquettes des écrans D8 à D14 : carte de donneur, alertes, réponse, historique, centres, profil, notifications. Création du projet Next.js de l'application : navigation et styles de base.
Zozerigué	Écrire le schéma SQL des 28 tables et le charger sur Supabase. Créer le projet Express. Inscription et connexion des donneurs et des agents (jeton de connexion).
Solange	Maquettes des écrans de prélèvement, de laboratoire, de stock, d'alertes, de distribution, de délivrance et de la fiche de traçabilité. Maquettes de l'espace administrateur, à valider avec Zozerigué. Création du projet Next.js de la plateforme.

Jalon J2 (dimanche 1er novembre) : maquettes validées, base de données créée, connexion fonctionnelle.

Semaine 3 : du 2 au 8 novembre

Objectif : les premiers écrans prennent vie.

Qui	Tâches de la semaine
Toute l'équipe	Obtenir du CNTS, avant le dimanche 8 novembre, les valeurs de l'Annexe E : délais entre dons, durées de conservation, analyses obligatoires, seuils de stock.
Hanaa, Johanne	Développement des écrans D1 à D7 sur les exemples JSON.
Zozerigué	Routes du compte donneur : profil, carte, mise en pause, historique, liste des centres. Vérification du numéro et récupération du mot de passe par WhatsApp. Réinitialisation du mot de passe par un agent. Pour les tests, les premiers comptes d'agents et les sites sont créés directement dans la base, en attendant l'espace administrateur.
Solange	Connexion des agents et tableau de bord. Recherche d'un donneur par son numéro et inscription sur place.

Semaine 4 : du 9 au 15 novembre

Objectif : toutes les routes de l'application des donneurs disponibles.

Qui	Tâches de la semaine
Hanaa, Johanne	Développement des écrans D8 à D14 sur les exemples JSON : carte de donneur, alertes, réponse, historique, centres, profil, notifications.
Zozerigué	Alertes : création, choix des donneurs (zone, éligibilité, pause, une alerte par semaine), envoi des notifications, réponses, clôture automatique. Rappel d'éligibilité.
Solange	Écrans des alertes : création avec estimation du nombre de donneurs, suivi des réponses en direct, clôture (P7).

Jalon J3 (dimanche 15 novembre) : toutes les routes de l'application des donneurs fonctionnent sur le vrai backend.

Semaine 5 : du 16 au 22 novembre

Objectif : brancher l'application et lancer la traçabilité.

Qui	Tâches de la semaine
Hanaa, Johanne	Branchement des écrans de compte et de la carte de donneur au vrai backend. Installation de l'application sur téléphone testée sur Android et sur iPhone.
Zozerigué	Passages au centre (apte ou ajourné) et création des poches. Génération des codes avec lettre de contrôle et des étiquettes. Analyses et préparation des produits, avec les dates de péremption. Chaque action est inscrite dans le journal des événements, au fur et à mesure.
Solange	Écrans d'accueil et de prélèvement, avec impression des étiquettes (P3). Champ unique « Scanner ou saisir le code ».

Semaine 6 : du 23 au 29 novembre

Objectif : l'application des donneurs est complète.

Qui	Tâches de la semaine
Hanaa, Johanne	Branchement des alertes, des notifications et des réponses au vrai backend. Test du parcours complet d'un donneur avec de vraies alertes.
Zozerigué	Stock calculé, seuils, produits qui périment bientôt, destruction. Demandes des dépôts, expéditions, réception et délivrance aux services. Début de l'espace administrateur : comptes et rôles (P1), centres et dépôts (P2).
Solange	Écrans du laboratoire et de la préparation (P4, P5). Écran du stock (P6).

Jalon J4 (dimanche 29 novembre) : application des donneurs entièrement branchée au vrai backend.

Semaine 7 : du 30 novembre au 6 décembre

Objectif : la plateforme est complète (priorité 1).

Qui	Tâches de la semaine
Toute l'équipe	Choisir le centre pilote avec le CNTS et fixer les dates du test avant le vendredi 4 décembre.
Hanaa, Johanne	Finitions : messages d'erreur, page hors connexion, affichage sur petits écrans. Si l'application est terminée : aide sur les écrans de la plateforme.
Zozerigué	Fiche de traçabilité (route du scan). Sécurité : droits par rôle et par site, déconnexion automatique, limites sur les codes. Fin de l'espace administrateur : seuils, durées de conservation, règles, consultation du journal. Choisir l'hébergement en ligne avant le vendredi 4 décembre.
Solange	Écrans de distribution (P8), de délivrance aux services (P10) et de la fiche de traçabilité (P9).

Jalon J5 (dimanche 6 décembre) : toutes les fonctionnalités de priorité 1 sont disponibles.

Semaine 8 : du 7 au 13 décembre

Objectif : tout tester et corriger.

Qui	Tâches de la semaine
Toute l'équipe	Test du scénario complet : alerte, réponse « Je viens », prélèvement, analyse, préparation, stock, expédition, réception au dépôt de l'hôpital, délivrance au service, fiche de traçabilité. Chaque bug est noté dans GitHub avec sa gravité.
Hanaa, Johanne	Tests sur plusieurs téléphones et corrections de l'application. Guide d'utilisation court pour les donneurs.
Zozerigué	Corrections du backend et de l'espace administrateur. Préparation de la mise en ligne et sauvegarde de la base de données.
Solange	Corrections de l'espace agent. Guide d'utilisation court pour les agents.

Le vendredi 11 décembre, jour de la fête nationale, est compté comme jour libre.

Jalon J6 (dimanche 13 décembre) : version prête pour la mise en ligne, aucun bug bloquant.

Semaine 9 : du 14 au 20 décembre

Objectif : mise en ligne, test réel et livraison.

Qui	Tâches de la semaine
Toute l'équipe	**Lundi 14 décembre** : mise en ligne de l'application, de la plateforme et du backend. **Mardi 15 décembre** : formation des agents du centre pilote. **Du mercredi 16 au vendredi 18 décembre** : test dans le centre pilote, avec un point quotidien sur les problèmes. **Samedi 19 décembre** : corrections urgentes et bilan du test. **Dimanche 20 décembre** : livraison du prototype et de sa documentation.
Hanaa, Johanne	Aide aux premiers donneurs pour installer et utiliser l'application.
Zozerigué	Surveillance du backend pendant le test et corrections urgentes.
Solange	Aide aux agents sur place pendant le test.

Jalon J7 (dimanche 20 décembre) : prototype livré.

4. Dépendances à surveiller

Ces points ne dépendent pas seulement du code. S'ils prennent du retard, tout le calendrier glisse : ils sont donc suivis à chaque point d'équipe.

Ce qu'il faut obtenir	Avant le	Pourquoi	Qui s'en occupe
Confirmation du choix de l'application web installable (PWA)	mercredi 21 octobre	Les maquettes de l'application en dépendent	Hanaa, Johanne
Compte WhatsApp Business et numéro du projet	dimanche 1er novembre	Nécessaires à la vérification du numéro, développée en semaine 3	Zozerigué
Valeurs de l'Annexe E fournies par le CNTS	dimanche 8 novembre	Utilisées dès la semaine 5 : analyses, péremption, seuils	Toute l'équipe
Centre pilote choisi et dates du test fixées	vendredi 4 décembre	Préparer la formation et le test de la semaine 9	Toute l'équipe
Hébergement en ligne choisi	vendredi 4 décembre	Mise en ligne du lundi 14 décembre	Zozerigué

5. Règles de suivi

- **Un point d'équipe par semaine**, toujours le même jour, de 30 minutes au plus : ce qui est fait, ce qui bloque, ce qui vient.
- Chaque fin de semaine, chacun envoie son travail sur GitHub, même s'il n'est pas terminé.
- Un jalon non atteint est signalé à toute l'équipe le jour même, avec une nouvelle date réaliste.
- En cas de retard de plus d'une semaine, l'équipe décide ensemble quoi reporter, en protégeant d'abord la boucle principale : alerte, réponse, prélèvement, analyse, stock.
- La semaine 8 sert aussi de marge : si une tâche des semaines précédentes déborde, elle est terminée en début de semaine 8.
- **La priorité 2** (réactions après délivrance, rappel de lot, message au donneur) n'est pas prévue dans ce calendrier. Elle sera planifiée après le 20 décembre, ou plus tôt si l'équipe est en avance.
- Ce calendrier sera ajusté si l'école ou le CNTS fixe d'autres dates.
